



Agenda





Einleitung

Projektumfeld



ChangeIT Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Fachverlag für IT Hannover & Hildesheim

320 Mitarbeiter



Einleitung

Projektidee

- Altes Kassensystem ist veraltet
 - Erfüllt nicht die KassensichV



- Geschäftsführung wünscht sich iPad-Lösung
 - Digitalisierung interner Prozesse





Einleitung

Projektziele


- Erfüllung der KassensichV
- Kompatibilität mit vorhandener Hardware
 - iPads Gen6 + SumUp Air
- Verwaltung über Cloud
 - Möglichkeit für Offline-Betrieb



Verringerung von Prozesszeiten



Projektphasen

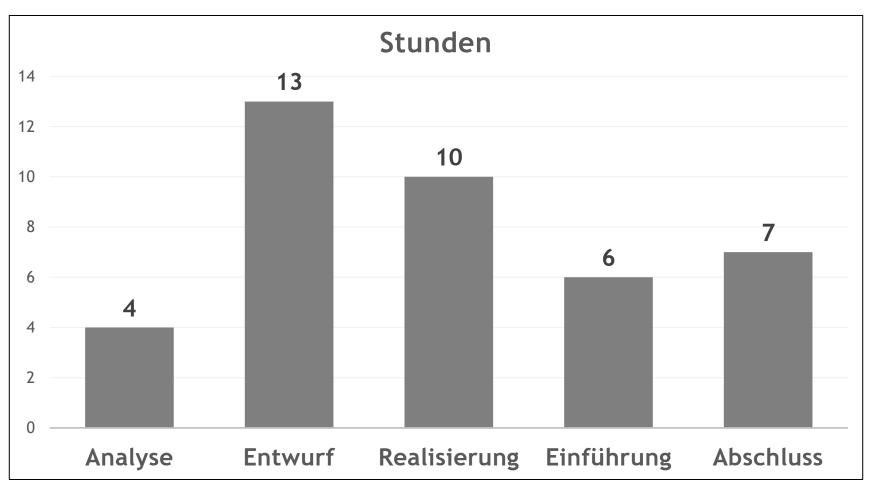



Projektkosten

• Einführungsphase:

```
Azubi-Stundensatz
9,29 € / h
6 h
```

• Ressourcennutzung p.P. 15,00 € / h 27,5 h




Projektkosten

Projektphase	Stu	Kosten	
	Azubi	Mitarbeiter	
Analyse	4 h	2 h	177,16€
Entwurf	13 h	/	315,77€
Realisierung	10 h	1 h	282,90€
Einführung	6 h	21,5 h	1.005,74€
Abschluss	7 h	4 h	330,03€
Gesamt			2.111,60€






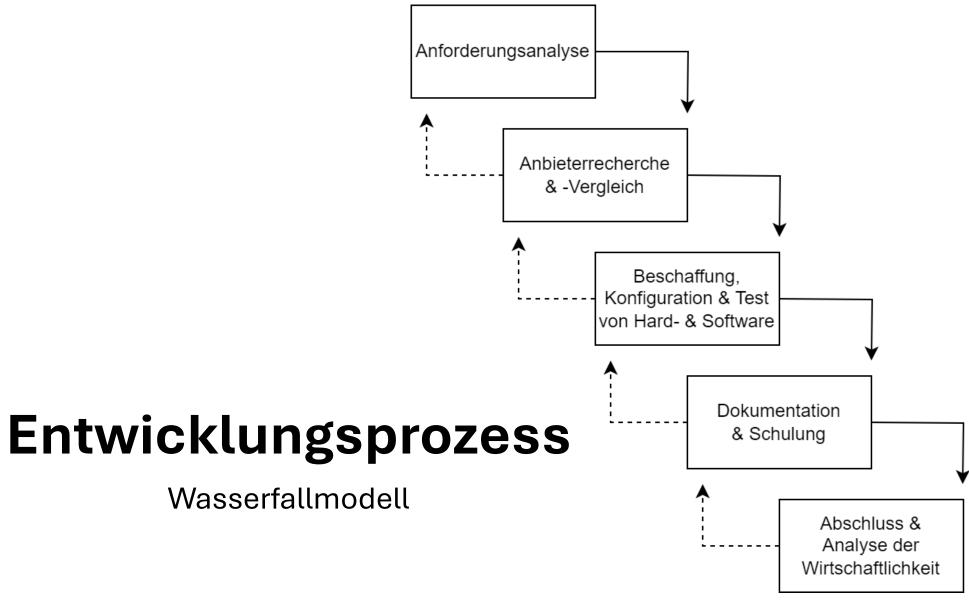



Vorgehen







ENTWURF



REALISIERUNG



Analyse

Lastenheft

- Befragung der Abteilungen:
 - Buchhaltung, Vertrieb & Direktmarketing
- Leichter Artikelimport
- Abbildung aller Bereiche getrennt in einem System
- Umfangreiche Auswertungen mit Export



Entwurf

Anbieterwahl

- SumUp POS
- SystemA
- SystemB

SystemC



Nr	Bezeichnung	Preis	USt	Basis	aktiv	Gruppe
1201	IT-Security mittels VPN	209,00	7	brutto	1	IT-Sec/Bücher



Vorgehen

Realisierung

- Einkauf
- Konfiguration
- Test






- Vorbereitung Einführungsphase
 - Dokumentation & Schulung



Abschluss





14



SOLL-IST-VERGLEICH



AMORTISATION




AUSBLICK & FAZIT



Ergebnisse

- Erfüllung der KassensichV
- Kompatibilität mit vorhandener Hardware
 - iPads Gen6 + SumUp Air
- Verwaltung über Cloud
 - Möglichkeit für Offline-Betrieb














Soll-Ist-Vergleich

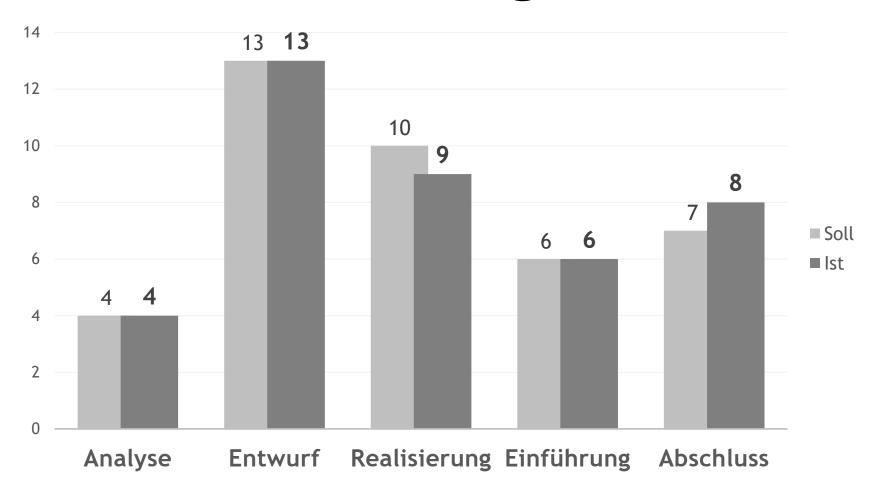



Amortisationsrechnung

- Jährliche Abokosten bei 4 Veranstaltungen:
- $4 \times 54,00 + 8 \times 5,00 = 256,00 \in$
- Zeiteinsparung von 7 h bei jeden der 8 Nutzer & 4 Veranstaltungen pro Jahr:
- $7 \times 8 \times 4 = 224 \text{ h} \times 25,00 \in = 5.600,00 \in$

• $2.852,06 / (5.600,00 - 256,00) \approx 0,54 \text{ Jahre} \approx 28 \text{ Wochen}$



Ausblick & Fazit

- Projektergebnis (Kassensystem) wird weiterverwendet
- Statischer Projektablauf glich Zeitmangel von Mitarbeitern aus
- Dokumentation schwerer als erwartet



Bildquellen

Unsplash:	https://unsplash.com/de/fotos/eine-person-verwendet-	
Hintergrund Startfolie	ein-pos-gerat-in-einem-geschaftgkndM1GvSA	
Flaticon: Icons	https://www.flaticon.com/	
Ready2order:	https://ready2order.com/de/ipad-kassensystem/	
Realisierung	https://ready2order.com/de/funktionen/kassenhardware/	







Disclaimer

Diese Präsentation zum Abschlussprojekt eines Kaufmanns für Digitalisierungsmanagement wurde für schulische Ausbildungszwecke im Rahmen der Prüfungsvorbereitung zur AP2 zur Verfügung gestellt und auf ein Modellunternehmen der MMBbS übertragen.

Vielen Dank an den Absolventen hierfür.

Die Präsentation wurde hinsichtlich einiger Gestaltungselemente bzw. der Inhalte verfremdet. Die Präsentation ist im Zusammenhang des PV-Unterrichts zu sehen.
